



ประกาศ อบต.วังขอนขว้าง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.วังขอนขว้าง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.วังขอนขว้าง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วังขอนขว้าง

"ตำบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจดีมีคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการ"

ข. พันธกิจ ของอบต.วังขอนขว้าง

- ๑ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- ๒ ประชาชน มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่
- ๓ โครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและทั่วถึงให้กับประชาชน
- ๔ ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
- ๕ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาครัฐและประชาชน
- ๖ ชุมชนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่


ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.วังขอนขว้างได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- การพัฒนาตำบลน่าอยู่
- การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ


ง. การวางแผน

อบต.วังขนขว้าง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.วังขนขว้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

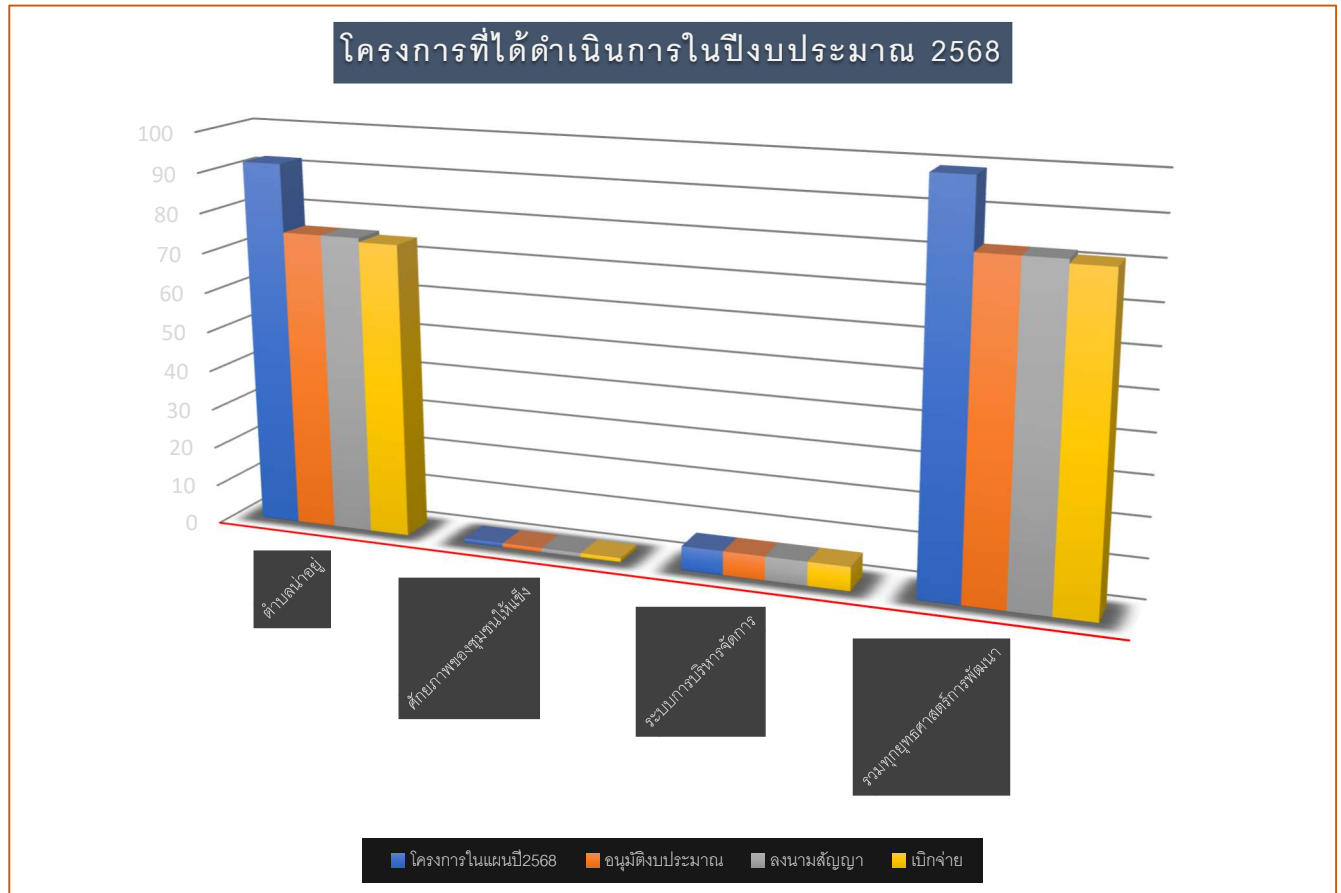

แผนภูมิแสดงการใช้งบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

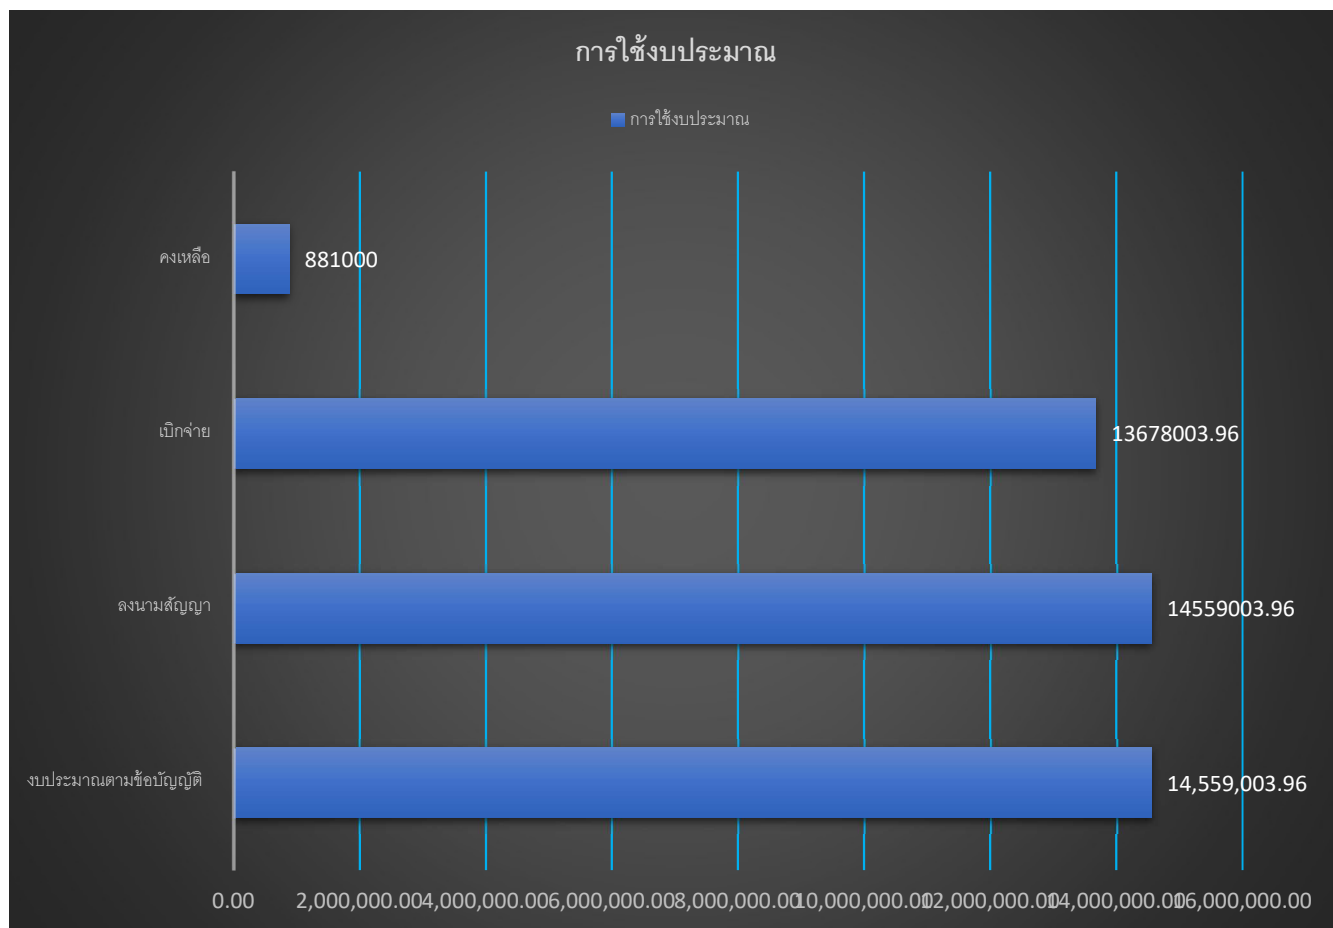

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.วังขนขว้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ ๑๔,๕๕๙,๐๐๓.๙๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๘	โครงการตาม ข้อบัญญัติ๒๕๖๘	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่	๘๕	๗๕	๑๓,๖๓๕,๓๓๐.๙๖
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง	๑	๑	๑๒๕,๑๐๐.๐๐
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ	๖	๖	๗๙๘,๕๗๓
รวม	๙๒	๘๒	๑๔,๕๕๙,๐๐๓.๙๖

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอป.วังขนขว้าง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายพราย งาม สายสุจริต	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อ พัก หมู่ที่ ๖ ช้างบ้าน นางปิยะนุช สอนธรรม	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๖ ช้างบ้านนายชัยยัณต์ ดำนหา	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๔	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ช้างบ้านนาง บัวทอง สอฮอง ถึง บ้านนางสมจิตร์ เคน วงษ์	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๕	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ช้างบ้านนาย แสวง แก้วพรม ถึงช้าง บ้านนายกิตติศักดิ์ ปัน เคลือบ	๑๐๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๖	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๓ บริเวณช้างบ้าน นายชาตรี สีสมุทธถึง บ้านนางฉวีวรรณ วงศ์คำนา	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม๒๕๖๗	แล้วเสร็จ

๗	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๒๔,๓๐๐.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	มกราคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บริเวณทาง หลวงชนบท หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนาย บัญชา เนตรวร หมู่ที่ ๖	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธันวาคม๒๕๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณคลอง ยายปืด หมู่ที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มกราคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๑๑	ปรับปรุงอาคารเก็บ พัสดุสำนักงาน หมู่ที่ ๔ บริเวณอาคารหลัง สำนักงาน อบต.วัง ขอนขว้าง	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ที่ ๑ บริเวณข้างบ้าน นายเชิด พองงาม	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ที่ ๒ บริเวณข้างนา นายระดม เปราะสง่า	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บริเวณหลังวัด ดงแก้ว	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายป่ายูคา หมู่ที่ ๖ บริเวณสายป่ายูคา	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บริเวณสายป่า สัก	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๑๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บริเวณถนน คลองโคกสิงห์(วังทอง)	๓๙,๕๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้ เหมาะสมและ ปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลยาเสพติด	๑๐๓,๙๘๕.๐๐	๑๐๓,๙๘๕.๐๐	๑๐๓,๙๘๕.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๐	ปรับปรุงหินคลุกและ ปรับปรุงดิน หมู่ ๔ ด้านหน้าสำนักงาน อบต.วังขอนขว้าง	๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บริเวณคลอง หลังอ่างห้วยหิน	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บริเวณคลอง โคกสิงห์	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๕ ช้างบ้านนาย ศราวุธ มีสุวรรณ	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ ๑ จำนวน ๒ จุด บริเวณ	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

	บ้านนายละนอง นาม ชั้นทอง						
๒๕	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๑ ซอยข้างบ้าน นายเสริมวิทย์ มรกต	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๖	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๒ บริเวณข้าง บ้านนายผลา สุธิ ประภา	๗๑,๕๐๐.๐๐	๗๑,๕๐๐.๐๐	๗๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๗	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ๒ บริเวณทาง หลวงชนบท	๗๖,๕๐๐.๐๐	๗๖,๕๐๐.๐๐	๗๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านการดูแล รักษาสุขภาพเบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุและ กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาส ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	๗๓,๓๐๔.๐๐	๗๓,๓๐๔.๐๐	๗๓,๓๐๔.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๒๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาง หาว บุตตา หมู่ ๔	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๐	วางบ่อพัก คสล. พร้อมติดตั้งฝาทะ แกรงเหล็ก หมู่ ๓ หน้าบ้านนายแสง แก้วพรม	๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๑	ปรับปรุงฝาบ่อพัก เหล็ก หมู่ ๓ บริเวณ ข้างวัดวังขอนขี้ ขี้	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

๓๒	ปรับปรุงฝาบ่อพัก เหล็ก หมู่ ๖ บริเวณ ซอยบ้านก้านสนสฤษดิ์ จันยุพา	๖๓,๕๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	เมษายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ ๕ บริเวณนายนายอำเภอ สีสมุท	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ ๔ บริเวณคลองห้วยวัว ตาย	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ ๕ ข้างสระวัดวังขอน ขว้าง	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ ๕ บริเวณนายนายจรี พิกุล เงิน	๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๗	จ้างปรับปรุงถนนหิน คลุก หมู่ ๖ บริเวณ หลังอ่างห้วยหิน	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๘	จ้างปรับปรุงถนนหิน คลุก หมู่ ๖ ซอยบ้าน ก้านถึงถนนพระยา กำจัด	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บริเวณซอยข้าง บ้านนางรุ่งอรุณ สีดา คุณ	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บริเวณซอย ๘ ชุมชนบ้านนา	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บริเวณหลังร้าน รุ่งเจริญสตรี ชุมชน บ้านนา	๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อ ดำเนินการจัดสวัสดิ ภาพสัตว์การสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๒๕,๙๒๐.๐๐	๒๕,๙๒๐.๐๐	๒๕,๙๒๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๓	ก่อสร้างดาดคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๔ บริเวณคลองโคกสิงห์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๔	ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ ๓ หน้าอู่ นาย สมคิด แก้วสิงห์	๖๖๗,๘๕๐.๐๐	๖๖๗,๘๕๐.๐๐	๖๖๗,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๕	ปรับปรุงลานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๔ บริเวณหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๖	ปรับปรุงลานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๔ บริเวณข้างอาคาร เอนกประสงค์ อบต.วัง ขอนขว้าง	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ บริเวณซอยข้าง บ้านนางวิภา แสวงหา	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๘	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายในชุมชน (หมู่ที่ ๒-๖ ตำบลวัง ขอนขว้าง)	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๔๙	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑ บริเวณหน้า	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

	บ้านนายเชิด ฟอง งาม						
๕๐	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑ บริเวณหน้า บ้านนางนาฏลัดดา สอนมานะ	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๕๑	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย ห้องประชุมอาคาร สำนักงาน ชั้น ๒ อบต. วังขอนขว้าง หมู่.๔	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๕๒	ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. หมู่ ๔ บริเวณหน้าบ้านนายสุ ริยพงษ์ เพชรรักษ์	๑๒,๙๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๕๓	ปรับปรุงวางท่อระบาย น้ำ คสล. หมู่ ๔ บริเวณที่น่านาง สังเวียน สีดาพงษ์	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๕๔	ก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. หมู่ ๕ บริเวณหน้าบ้านนายวี ระ แสงจันทร์	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ บริเวณซอย ๑๐ ชุมชนบ้านนา	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ ข้างบ้านนางป ภาพร เขียวเจริญ	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๕๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๖ บริเวณถนน พระยากำจัด	๑๓๐,๑๗๑.๙๖	๑๓๐,๑๗๑.๙๖	๑๓๐,๑๗๑.๙๖	๐.๐๐	มีนาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

๕๘	ปรับปรุงถากถางและ ล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔,๖ บริเวณคลองโคกสิงห์	๗๗,๙๐๐.๐๐	๗๗,๙๐๐.๐๐	๗๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๕๙	ปรับปรุงถากถางและ ล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๖ บริเวณคลองห้วยหิน	๔๖,๙๐๐.๐๐	๔๖,๙๐๐.๐๐	๔๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๐	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖ บริเวณ คลองลำรางริมถนน พหลโยธิน ต.วังขอน ขว้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สิงหาคม๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๑	ปรับปรุงถากถางและ ล้มต้นไม้บริเวณคลอง ห้วยวัวตาย หมู่ที่ ๔	๒๖,๙๐๐.๐๐	๒๖,๙๐๐.๐๐	๒๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายโยธิน กันหา หมู่ที่ ๖	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมทำห ้าง บริเวณคลองป่า สัก หมู่ที่ ๖	๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพระยากำจัด หมู่ที่ ๖	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๕	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้าน นายสมัย นาสัมภ หมู่ที่ ๓	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๖	ปรับปรุงลานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างอาคาร เอนกประสงค์ อบต.วัง ขอนขว้าง	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายทางข้างบ้าน นางทองเต็ม บุญมี หมู่ ที่ ๒	๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายทางข้างบ้าน นายอรุณ สำลี หมู่ที่ ๓	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายทางข้างบ้าน นางสโอด พวงแอม หมู่ ที่ ๕	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้าน นางสาวนาฏลัดดา สอนมานะ หมู่ที่ ๑	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๑ บริเวณข้างบ้านนาย เชิด พองามถึงบ้าน นายสายทอง พลอยสี ธรรมชาติ	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๖ สาย ทางบริเวณข้างบ้าน นางปพภร เขียวเจริญ	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๓	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ๔ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน	๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

๗๔	ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑ บริเวณหน้า บ้านนางกิตติพร นาค สุข ถึงบ้านนางกรรนิ กา ตำบลทิมเตศ	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๕	โครงการปรับปรุงงาน เสริมผิวแอสฟัลติกค อนกรีต บริเวณซุ้ม ประตูวัดห้วยวัวตายน หมู่ที่ ๔	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๖	โครงการติดตั้งโซล่า เซลล์ (หมู่ที่ ๑,๒,๔, และ หมู่ที่ ๖ ตำบลวัง ขอนขว้าง)	๑๒๕,๑๐๐.๐๐	๑๒๕,๑๐๐.๐๐	๑๒๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๔๙,๓๗๕.๐๐	๑๔๙,๓๗๕.๐๐	๑๔๙,๓๗๕.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๘	วัสดุก่อสร้าง	๙๓,๖๙๑.๐๐	๙๓,๖๙๑.๐๐	๙๓,๖๙๑.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๗๙	วัสดุไฟฟ้า	๑๒๑,๖๔๒.๐๐	๑๒๑,๖๔๒.๐๐	๑๒๑,๖๔๒.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๘๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐๕,๐๗๕.๐๐	๒๐๕,๐๗๕.๐๐	๒๐๕,๐๗๕.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๘๑	วัสดุสำนักงาน	๒๑๖,๐๙๐.๐๐	๒๑๖,๐๙๐.๐๐	๒๑๖,๐๙๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ
๘๒	วัสดุยานพาหนะ	๑๒.๗๐๐.๐๐	๑๒.๗๐๐.๐๐	๑๒.๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน๒๕๖๘	แล้วเสร็จ

อบต.วังขอนขว้าง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.วังขอนขว้างทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

- การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ในแต่ละประเภท ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานตลอดทั้งปี ทำให้ต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่มาดำเนินการจำนวนหลายครั้ง

ข้อเสนอแนะ

- ควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เพียงพอในการบริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายสมจิตร์ สีสมุทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขนาย
